

Alan Medeiros Alves Gonçalves
João Vitor Aguiar de Sousa
Raquel Melo de Queiroz

Relatório de processo de release

Engenharia de Software II

Campina Grande
2025

Março de 2025

Projeto: Marketplace

Histórico de revisões

→ Sempre que este documento for atualizado com novas informações, será registrado a data, a versão e a descrição das atualizações.

Data	Versão	Descrição
10/03/2025	1.0	Estruturação inicial do relatório de acordo com os tópicos solicitados; Descrição do backlog e de papéis
15/03/2025	1.2	Registro de PBI's e tasks juntamente com suas descrições
22/03/2025	2.0	Relatório da sprint 2 com descrição do backlog
31/03/2025	2.1	Adição do gráfico de burnout da sprint 2

Histórico de revisões e release do documento por sprint

→ A cada sprint, uma versão deste documento deve ser entregue. No histórico abaixo será demonstrado a versão correspondente a versão final de registros para a sprint correspondente.

Data	Versão	Descrição	Sprint
17/03/2025	1.2	Versão final do relatório de processo release I da sprint 1	1
31/03/2025	2.1	Versão final do relatório de processo release I da sprint 2	2

Referente à sprint 1:

Papéis no projeto

Para cada release do projeto, cada membro do grupo deve alternar-se entre si o papel de Gerente, o qual assumirá a responsabilidade de gerenciar o fluxo do projeto junto com as PBI's (Product backlog item). O papel de gerente da **Sprint 01** foi assumido pelo membro Alan Medeiros.

A tabela abaixo apresenta a distribuição de papéis por sprint

SPRINT 01

Alan Medeiros (Gerente, tester)	Estabelecimento da permanência de dados locais do projeto; Desenvolvimento de testes para compradores; Diagrama de classes do relatório-release 01; Registro da cobertura de códigos e relatório de testes do projeto para relatório-release 01; Descrição dos trabalhos em equipe do relatório-processo-release 01
João Aguiar (Desenvolvedor backend)	Desenvolvimento das funcionalidades de Compradores; Desenvolvimento das funcionalidades de Lojas
Raquel Melo (Tester, documentação)	Criação do repositório e pastas no Github; Desenvolvimento de testes para lojas; Descrição das funcionalidades no relatório-release 01; Diagrama de caso de uso do relatório-release 01; Diagrama de sequência do relatório-release 01; Descrição do backlog e itens de trabalho do Diagrama de caso de uso do relatório-processo-release 01.

Descrição do backlog

 	Order	ID	Title	Assigned To	State
	1	86	>  GitHub	Alan Medeiros	 Doing
	2	64	>  [Compradores] - Funcionalidades	Alan Medeiros	 Doing
	3	173	>  [Compradores] - Testes	Alan Medeiros	 To Do
	4	63	>  [Lojas] - Funcionalidades	Alan Medeiros	 Doing
	5	91	>  [Lojas] - Testes	Alan Medeiros	 To Do
	6	89	>  Relatório-release 01 versão 1	Alan Medeiros	 To Do
	7	177	>  Relatorio-processo-release 01 - versão 1	Alan Medeiros	 To Do

- **Descrição das PBI's e Tasks**

1. Github

Esta PBI está relacionada às atividades relacionadas à criação do repositório remoto no Github e a adição das pastas de releases do projeto para o deploy contínuo por relase.

2. Compradores - Funcionalidades

A PBI de compradores refere-se a todas as funcionalidades exercidas pela rota do usuário como um comprador no sistema. Suas tasks correspondem:

- Cadastrar comprador
- Permanência de dados
- Exibir comprador
- Buscar comprador
- Atualizar comprador
- Remover comprador
- Listar comprador

2	64	▼ [Compradores] - Funcionalidades	Alan Medeiros	● Doing
	68	✓ Cadastrar comprador	João Aguiar	● Doing
	70	✓ Permanência de dados	Alan Medeiros	● To Do
	139	✓ Exibir comprador	João Aguiar	● Doing
	140	✓ Buscar comprador	João Aguiar	● Doing
	143	✓ Atualizar comprador	João Aguiar	● Doing
	145	✓ Remover comprador	João Aguiar	● Doing
	146	✓ Listar comprador	João Aguiar	● Doing

3. Compradores - Testes

Para cada funcionalidade de Comprador, haverá testes para as mesmas.

3	173	▼ [Compradores] - Testes	Alan Medeiros	● Doing
	180	✓ Teste cadastro	Alan Medeiros	● To Do
	182	✓ Teste exibir	Alan Medeiros	● To Do
	184	✓ Teste buscar	Alan Medeiros	● To Do
	185	✓ Teste atualizar	Alan Medeiros	● To Do
	187	✓ Teste remover	Alan Medeiros	● To Do
	188	✓ Teste listar	Alan Medeiros	● To Do

4. Lojas - Funcionalidades

A PBI de Lojas refere-se a todas as funcionalidades exercidas pela rota do usuário como uma loja no sistema. Suas tasks correspondem:

- Cadastrar lojas
- Permanência de dados
- Exibir lojas
- Buscar lojas
- Atualizar lojas
- Remover lojas
- Listar lojas

4	63	▼  [Lojas] - Funcionalidades	:	Alan Medeiros	● Doing
	65	✓ Cadastrar lojas		João Aguiar	● Doing
	67	✓ Permanência de dados		João Aguiar	● Doing
	124	✓ Exibir lojas		João Aguiar	● Doing
	127	✓ Buscar lojas		João Aguiar	● Doing
	130	✓ Atualizar lojas		João Aguiar	● Doing
	133	✓ Remover lojas		João Aguiar	● Doing
	135	✓ Listar lojas		João Aguiar	● Doing

5. Lojas - Testes

Para cada funcionalidade de Comprador, haverá testes para as mesmas.

5	91	▼  [Lojas] - Testes	:	Alan Medeiros	● Doing
	66	✓ Teste cadastro		raquel.queiroz...	● To Do
	69	✓ Teste exibir		raquel.queiroz...	● To Do
	172	✓ Teste buscar		raquel.queiroz...	● To Do
	174	✓ Teste atualizar		raquel.queiroz...	● To Do
	175	✓ Teste remover		raquel.queiroz...	● To Do
	176	✓ Teste listar		raquel.queiroz...	● To Do
	197	✓ Teste de sistema		raquel.queiroz...	● To Do

6. Relatório-release 01 | versão 1

Corresponde ao relatório que deve ser desenvolvido a cada release. Este relatório deve conter:

- A descrição da arquitetura utilizada (diagramas de caso de uso, classes e sequência);
- As funcionalidades desenvolvidas e prints do terminal com exemplos da funcionalidade;
- Relatório de testes e cobertura de código.

Para a primeira release, deverá ser feito:


- Os diagramas atendendo os requisitos a serem desenvolvidos nesta release;
- Breve descrição das funcionalidades que foram atendidas e prints do terminal com exemplos da funcionalidade;
- Relatório dos testes cobertos.

7. Relatório-processo-release 01 - versão 1

Corresponde a este documento responsável por relatar o processo a cada sprint. Para o relatório de processo, deverá ser incluso:

- O backlog com os itens de trabalho e as tasks;
- Descrição da organização da equipe, os papéis de cada membro;
- Um print do gráfico de burndown de cada sprint.

Print do gráfico de burnout

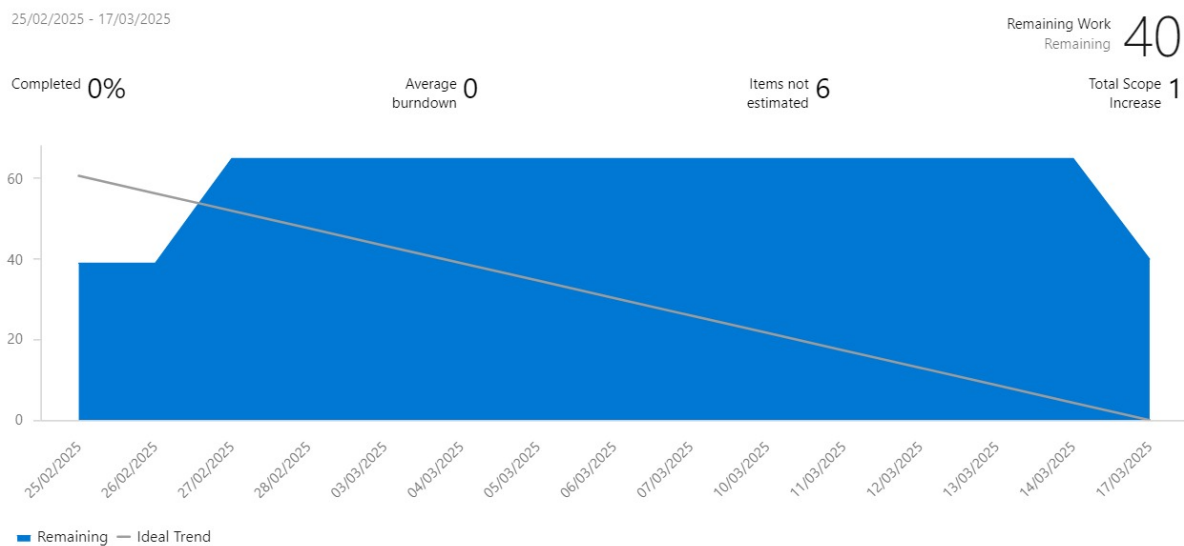

Referente à sprint 2:

Papéis no projeto

Para cada release do projeto, cada membro do grupo deve alternar-se entre si o papel de Gerente, o qual assumirá a responsabilidade de gerenciar o fluxo do projeto junto com as PBI's (Product backlog item). O papel de gerente da **Sprint 02** foi assumido pelo membro João Aguiar.

A tabela abaixo apresenta a distribuição de papéis por sprint

SPRINT 02

Alan Medeiros (Tester, frontend)	Testes para administrador; Implementação da fachada; Implementação da persistência de dados; Documentação dos relatórios
João Aguiar (Gerente, frontend)	Desenvolvimento de menus; Testes de produtos; Integração de dados com o backend
Raquel Melo (Tester, documentação, frontend)	Desenvolvimento de menus; Testes de produtos; Documentação dos relatórios

Descrição do backlog

1	254	>  Frontend	João Aguiar	 To Do
2	226	>  Testes	João Aguiar	 Done
3	233	>  Persistência	João Aguiar	 Doing
4	234	>  Relatório-release 01 versão 2	⋮ João Aguiar	 Done
5	204	>  Relatorio-processo-release 01 - sprint 2	João Aguiar	 Doing

- **Descrição das PBI's e Tasks**

1. Frontend

1	254	▼  Frontend	João Aguiar	● To Do
	255	✓ Criar menu de produtos	João Aguiar	● To Do
	256	✓ Criar fachada	Alan Medeiros	● To Do
	257	✓ Criar menu de lojas	Raquel Melo de...	● To Do
	258	✓ Criar menu de usuários	João Aguiar	● To Do
	259	✓ Criar menu de administrador	Raquel Melo de...	● To Do

Para a PBI do frontend, foram definidas as seguintes tasks:

- Criar menu de produtos
- Criar fachada
 - Referente a conexão da interface com o sistema de forma independente
- Criar menu de lojas
- Criar menu de usuários
- Criar menu de administrador

2. Testes

2	226	▼  Testes	:	João Aguiar	● Done
	248	✓ [Produtos] - Cadastro de produtos		João Aguiar	● Done
	249	✓ [Produtos] - Exibir produtos		João Aguiar	● Done
	250	✓ [Produtos] - Buscar produtos		João Aguiar	● Done
	251	✓ [Produtos] - Atualizar produtos		João Aguiar	● Done
	252	✓ [Produtos] - Remover produtos		Raquel Melo de...	● Done
	253	✓ [Produtos] - Listar produtos		Raquel Melo de...	● Done
	260	✓ [ADMIN] Cadastro de adm		Alan Medeiros	● Done
	261	✓ [ADMIN] atualizar adm		Alan Medeiros	● Done
	262	✓ [ADMIN] Remover adm		Alan Medeiros	● Done
	263	✓ [ADMIN] Listar adms		Alan Medeiros	● Done
	264	✓ [ADMIN] Buscar adms		Alan Medeiros	● Done

Para a PBI de testes, foram definidas as tasks referentes aos testes para produtos e administrador com suas respectivas funções atreladas. Esses testes foram desenvolvidos e concluídos na sprint 1, mas foram trazidos para a sprint 2 com o objetivo de testar as novas atualizações das funcionalidades que seriam implementadas no decorrer da sprint 2.

3. Persistência

3	233	▼  Persistência		João Aguiar	● Doing
	70	✓ Permanência de dados		Alan Medeiros	● Doing
	281	✓ Integração com o backend		João Aguiar	● To Do

Em persistência, foi atribuída as tasks de:

- Permanência de dados
 - Referente a implementação da biblioteca para o banco de dados foi utilizado a serialização do próprio java
- Integração com o backend
 - Referente a união do backend com o banco de dados.

4. Relatório-release 01 | versão 2

4	234	▼  Relatório-release 01 versão 2	João Aguiar ● Done
	198	✓ Relatório de testes e cobertura de código	Alan Medeiros ● To Do
	276	✓ Criar a pasta 'releases' no github	Raquel Melo de... ● To Do
	277	✓ Diagrama caso de uso	Raquel Melo de... ● To Do
	279	✓ Diagrama de classes	Alan Medeiros ● To Do
	280	✓ Diagrama de sequência	Raquel Melo de... ● To Do

Para essa PBI, retomaremos as mesmas tasks da sprint 1 para a nova versão do relatório de release 01

5. Relatório-processo-release 01 - sprint 2

5	204	▼  Relatorio-processo-release 01 - sprint 2	João Aguiar ● Doing
	206	✓ Backlog de itens e tasks	Raquel Melo de... ● Doing
	207	✓ Descrição dos trabalhos da equipe	Alan Medeiros ● To Do

Para essa PBI, retomaremos as mesmas tasks da sprint 1 para a nova versão do relatório de sprint, seguindo a estruturação padrão da primeira versão finalizada do relatório de sprint.

Print do gráfico de burnout

